

Blok 2E – Podsumowanie

5 Kluczowych lekcji z zarządzania projektami IT

Studia podyplomowe BIM | Kwiecień 2026

Co przeszliśmy dziś?

Blok	Aktywność	Narzędzie
1A	Teoria: metodyki, role, narzędzia	Wykład
1B	Konfiguracja Jira + Sprint Planning	Jira
2A	Sprint z AI (45 min)	Jira + ChatGPT/Copilot
2B	Daily Scrum	Jira Board
2C	Sprint Review + Velocity	Jira Reports
2D	Retrospektywa Start/Stop/Continue	Jira Task

Lekcja 1: Backlog > Plan Gantt'a

Dlaczego?

„Plan to nic, planowanie to wszystko.”
— Dwight D. Eisenhower

Plan Gantt'a	Backlog
Stałe wymagania	Dynamiczne wymagania
Zmiany = przeplanowanie	Zmiany = repriorytyzacja
Skupia się na czasie	Skupia się na wartości
Aktualizowany rzadko	Żywy dokument

Lekcja 1: Kiedy co stosować?

Gantt jest lepszy gdy:

- Wymagania są **stałe i znane z góry**
- Projekt ma zewnętrzne zobowiązania terminowe
- Regulacje narzucają sekwencyjność prac
- *(np. projekt budowlany, BIM w fazie wykonawczej)*

Backlog jest lepszy gdy:

- Wymagania **zmieniają się w trakcie**
- Klient odkrywa potrzeby podczas pracy
- Priorytetyzacja wartości biznesowej jest kluczowa
- *(np. aplikacja, oprogramowanie, produkt cyfrowy)*

Lekcja 2: Product Owner – rola dla każdego z Was

PO nie musi programować

„Product Owner to głos klienta i strażnik wartości produktu.”

Co robi PO:

- Definiuje **co** budujemy (nie **jak**)
- Priorytetyzuje backlog wg wartości biznesowej
- Akceptuje lub odrzuca przyrosty
- Reprezentuje interesariuszy w zespole

Lekcja 2: BIM Manager jako Product Owner

Analogia

Rola w IT	Odpowiednik w BIM
Product Owner	BIM Manager
Product Backlog	Lista wymagań BIM
Sprint	Faza projektu (koncepcja, PW, przetarg)
Increment	Dostarczona dokumentacja BIM
Stakeholder	Inwestor, projektant, wykonawca

*BIM Manager łączy architekturę, konstrukcję i instalacje
— tak jak PO łączy biznes z technologią.*

Lekcja 3: Definition of Done

Bez DoD każdy ma inne rozumienie słowa „gotowe”

Przykład:

Osoba	Co znaczy „gotowe”
Developer	„Napisałem tekst”
QA	„Brak błędów fabularnych”
PO	„Spełnia oczekiwania czytelnika”
Stakeholder	„Jest na stronie / do pobrania”

Lekcja 3: DoD w praktyce

Dobry Definition of Done to kontrakt wewnętrzny

Definition of Done – Rozdział powieści:

- ✓ Tekst ≥ 300 słów
- ✓ Imiona postaci spójne
- ✓ Styl odpowiada gatunkowi
- ✓ Wklejony do dokumentu
- ✓ Review przez QA
- ✓ Story = Done w Jira

DoD eliminuje dług techniczny.

W budownictwie: protokół odbioru = DoD.

Lekcja 4: Velocity – jedyne wiarygodne narzędzie

Co to jest Velocity?

Velocity = liczba Story Points ukończona przez zespół w jednym sprincie

Dlaczego to ważne?

Sprint 1: Velocity = 10 SP
Sprint 2: Velocity = 12 SP
Sprint 3: Velocity = 11 SP

Średnia: ~11 SP/sprint

Backlog: 88 SP pozostało
Prognoza: $88 \div 11 = 8$ sprintów

Lekcja 4: Story Points ≠ godziny

Dlaczego nie szacujemy w godzinach?

Szacowanie w godzinach	Story Points
Pressure – „8 godzin to 8 godzin"	Bez presji – względna skala
Senior: 2h, Junior: 8h – różne osoby	Zespołowe szacowanie
Uwzględnia optymizm	Empiryczne, oparte na historii
Tworzysz zobowiązanie	Tworzysz prognozę


Lekcja 5: Jira w praktyce – co warto zapamiętać?

Cecha	Jira Free
Użytkownicy	do 10
Scrum / Kanban	✓
CI/CD	✗ (Jira Software only)
Atlassian Ecosystem	Confluence, Bitbucket
Karty płatniczej	✗ nie trzeba

Wniosek:

Koncepcje są **identyczne** w każdym narzędziu. Jira to jeden z najpopularniejszych wyborów w branży.

Scrum w jednym slajdzie

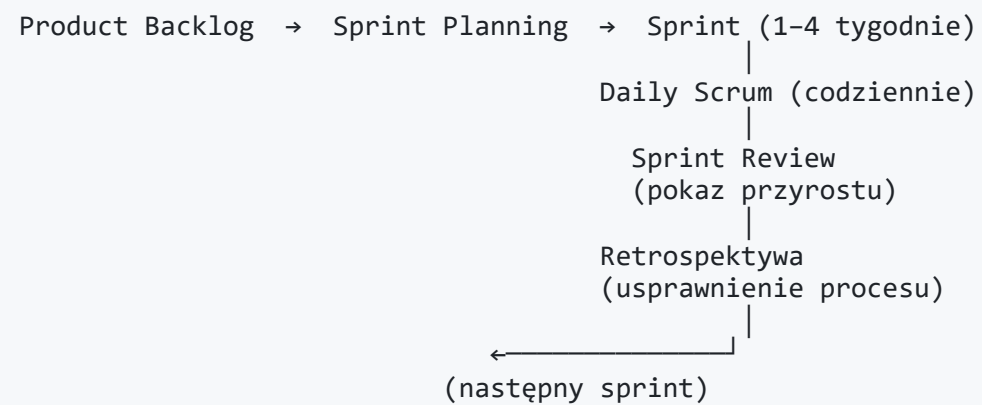

Pytania do dyskusji

Refleksja po zajęciach

1. Jak Agile może się zastosować do projektu BIM?
(Co byłby *backlogiem*? Co *sprintem*? Kto byłby *PO*?)
2. Jaką rolę wybralibyście w prawdziwym projekcie IT?
3. Co było największym wyzwaniem podczas pracy zespołowej dziś?
4. Co zrobilibyście inaczej w **Sprint 2**?
5. Co w Jira było najbardziej przydatne, a co sprawiło trudność?

Najważniejsze pojęcia – ściągawka

Pojęcie	Definicja
Backlog	Priorytetowa lista wymagań projektu
Sprint	Timeboxed iteracja (1–4 tygodnie)
Story Points	Względna miara złożoności zadania
Velocity	SP ukończone w jednym sprincie
DoD	Uzgodnione kryteria „gotowości”
Impediment	Przeszkoda blokująca pracę
WIP Limit	Max zadań „w toku” naraz
Increment	Gotowy przyrost po sprincie

Dziękuję za udział w zajęciach!

Co zabrać ze sobą

-  Konto Jira (zostaje – bim-[nazwazespolu].atlassian.net)
-  Projekt powieści (macie link do dokumentu)
-  Doświadczenie jednego pełnego sprintu Scrum
-  Wiedza o rolach, metodykach i narzędziach

Materiały do zajęć

Wszystkie pliki: **Bloki/** w repozytorium GitHub

Plan zajęć: **Dokumentacja/PlanZajec.md**

Backlog kolejnych zajęć?

Jeśli mielibyśmy więcej czasu...

- Sprint 2 – dokończenie powieści
- Kanban Board – praca bez sprintów
- CI/CD – automatyczne „wydawanie” rozdziałów
- Raporty i dashboardy w Jira
- Skalowanie Agile – SAFe, LeSS
- Agile w projektach BIM – case study

„Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem” — Manifest Agile
